

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.10.24

KAV : Lina Jokubauskienė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Šturmanų g. 20 Klaipėda

Problema : Esant lietu per nesandarų stogą prateka į gyvenamąsias patalpas

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Stogo dangos nuvalymas, paruošimas naujai dangai, nuolydžio formavimas	M2	65
2	Bituminės dangos prilydimas apjuosiant vent kaminėlį bei pakišant po parapetu (2 sluoksniai)	M2	65
3	Atliekų, bei visų šiukšlių nurinkimas nuo stogo bei utilizavimas	KG	100
4	Virš 2-os laiptinės bituminės stogo dangos nuvalymas	M2	15
5	Virš 2-os laiptinės papildomo bituminės dangos sluoksnio prilydymas	M2	15
6	Darbo vietos susitvarkymas	VNT.	1


Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.









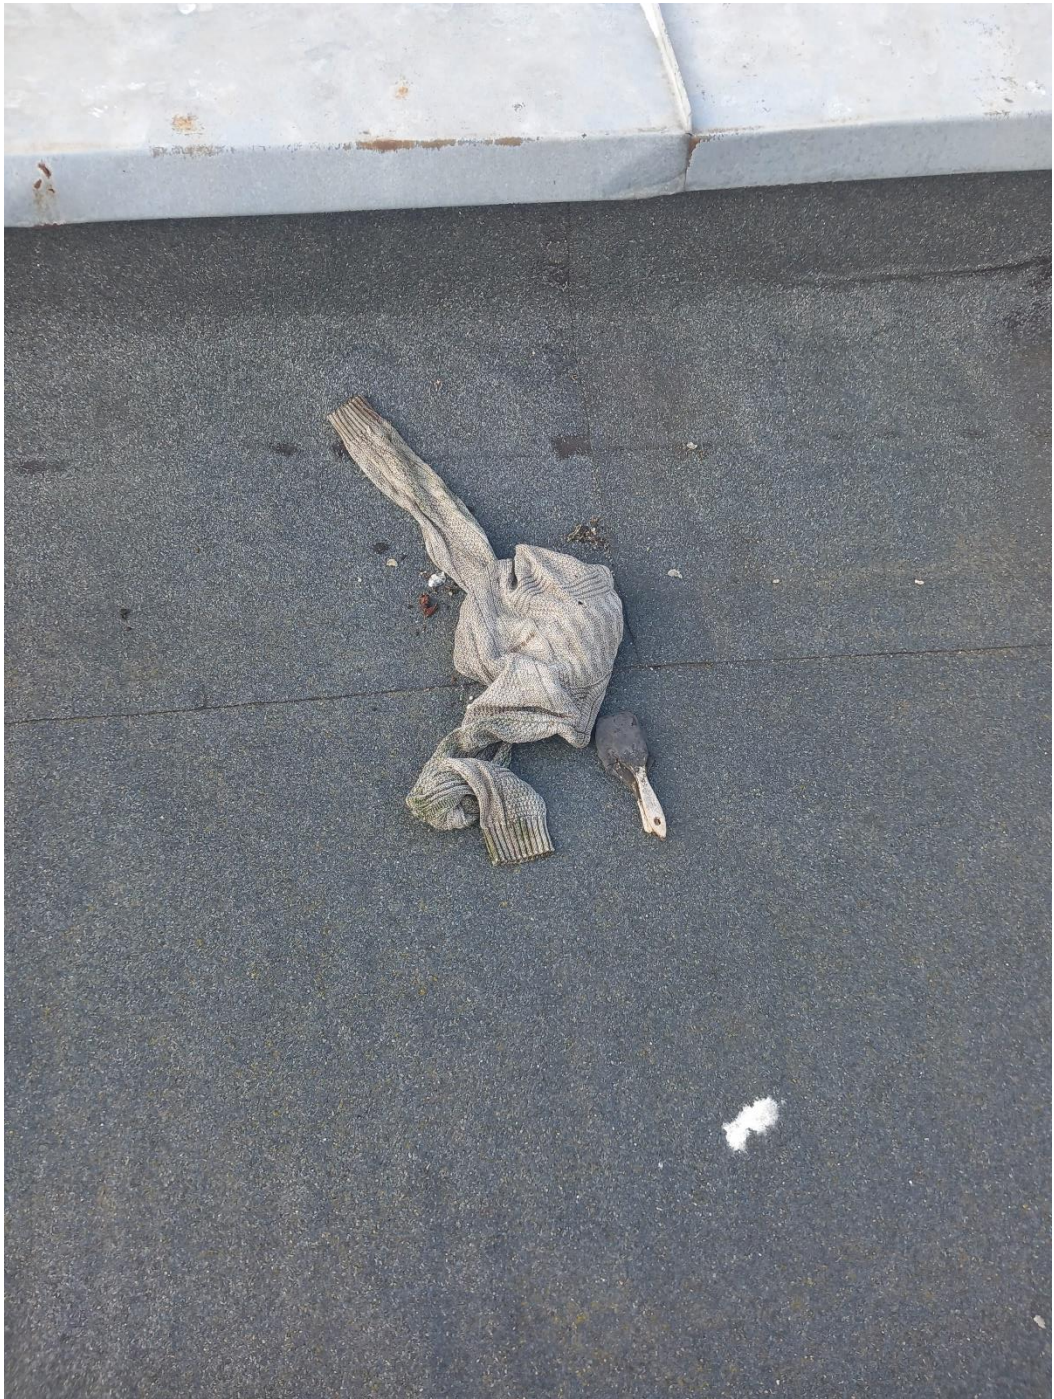



Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Silkauskas'.

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)
