

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2025.06.05

KA : Inga Bružienė


Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Vanagupės g. 24, Palanga

Problema : 87 buto balkone esančios plytelės skilusios, atsisluoksniavusios. Glaistas tarp plytelių ištrupėjęs.


El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1.	Esamų deformuotų plytelių demontavimas	m ²	2
2.	Pasiruošimas klijavimui (plytelių klijų šalinimas nuo esamo paviršiaus)	m ²	2
3.	Plytelių klijavimas (dydi ir spalva taikyti pagal esamas plyteles)	m ²	2
4.	Germetinimas (pagal plyteles ir nuolašinę skardos lankstinį, aplink perimetrą pagal fasado apdailą, turėklus ir pertvaras)	m	18
5.	Siūlių tarp plytelių valymas, pasiruošimas naujam siūlių glaistymui	m	43
6.	Autobokštelio nuoma	Vnt.	1
6.	Darbo vietos sutvarkymas	Kopl.	1

Pastaba: Atliekami darbai lokaliai 87 buto balkone. Darbus atlikti technologiškai kaip numato medžiagų gamintojas. Atliekamų darbų kiekius tikslinti darbo vietoje. Plyteles demontuoti tik pirmą eilę einančią pagal balkono lauko kraštinę. Plytelių spalvą ir dydį derinti pagal esamas plyteles. Buto savininkė prašo darbus atlikti nuo rugpjūčio galo. Visos naudojamos medžiagos turi būti skirtos lauko darbams atlikti.

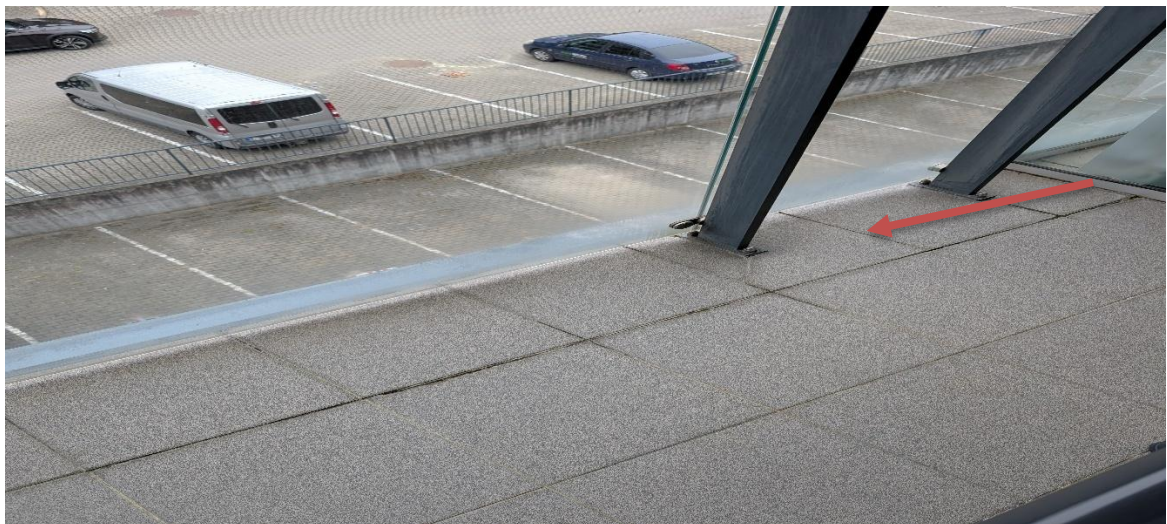



APŽIŪROS DALYVIAI:

Alexeys Potokhinskiy
Techninis inžinierius


(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)
